



# Progresso de Projetos - TC

## Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Escola de Trabalho e Produção do ...

Custos

Todos

### Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	15/06/2020	12/08/2022	1.461	1.060
<b>Total</b>			<b>1.461</b>	<b>1.060</b>

### Progresso Físico


% Previsto	% Realizado
97,25%	94,00%

### Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Escola de Trabalho e Produção do P...	25.000.000	21.916.911
<b>Total</b>	<b>25.000.000</b>	<b>21.916.911</b>

### Cronograma | Linha do Tempo

et 2020 out 2020 nov 2020 dez 2020 jan 2021 fev 2021 mar 2021 abr 2021 mai 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 set 2021 out 2021 nov 2021 dez 2021 jan 2022 fev 2022 mar 2022 abr 2022 mai 2022 jun 2022 jul 2022 ago 2022

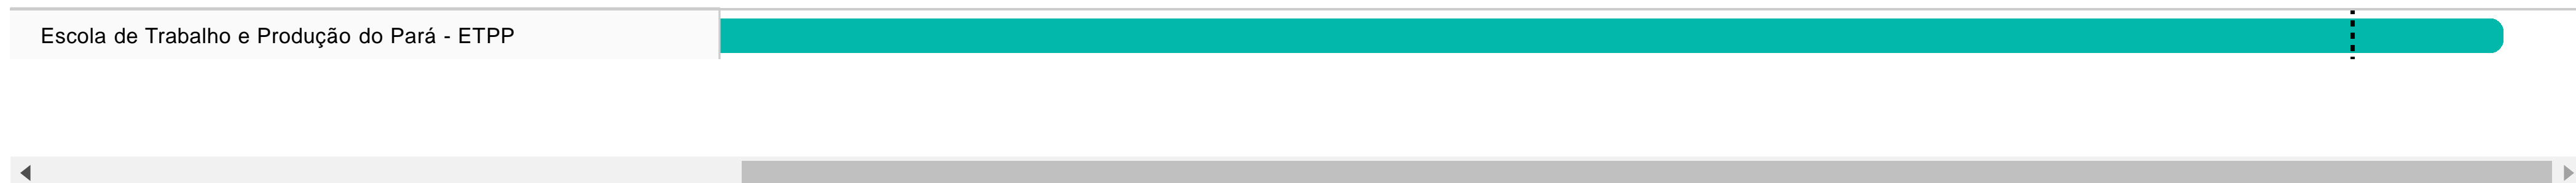

### Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Término	Status	KPI
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Engenharia	06/04/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Suprimentos	14/09/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Construção	30/06/22	Em andamento	!
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Gerenciamento	30/06/22	Em andamento	!
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Conclusão do Projeto	15/08/22	Futuro	○

### Previsto vs Realizado

